

БЫСТРЫЙ СТАРТ В LYNX

Создавайте проекты легко!

A-dato

High Performance Delivered

Содержание

2

- Загрузите LYNX →
- Регистрация и вход (3)
- Базовые настройки (8)
 - Календарь
 - Навыки
 - Ресурсы
- Создайте первый проект (17)
- Запустите свой проект и создайте первые активные задачи (32)
- Обновите прогресс в Моих действиях (36)

- Прочее:
 - Несколько советов и трюков (37)
 - Дополнительная информация

<https://www.arbconsulting.ru/bi/ccpm-software/>

ЗАГРУЗИТЬ ДЕМО LYNX

Регистрация нового пользователя ИЛИ вход с (новыми) учетными данными, полученными в email

3

Добро пожаловать в Lynx
Copyright © 2009-2018 A-dato B.V., "АРБ-Консалтинг" - оф. пред. в РФ.
версия 25.10.7074.54268 [x64]

support@a-dato.com
www.a-dato.com

Лynx

Войти

Пожалуйста, введите ваш логин

Сохранить регистрационную информацию

Эл. адрес

Пароль

Создать
НОВЫЙ
аккаунт

Если вы приглашены как новый пользователь, используйте присланный пароль, который затем можно изменить в настройках вашего профиля

Если вы получили приглашение присоединиться к LYNX (от админа, коллеги, владельца пространства), ваши учетные данные будут указаны в пригласительном email

From: Mike Dempsey <support@a-dato.com>
Date: 2015-05-04 14:04 GMT+02:00
Subject: You have been invited to join our platform
To: your.email@yourcompany.com
Cc: Mike Dempsey <mike.dempsey@kaikes.com>

Hello,

You have been invited to join the A-Dato Project Management platform named Lynx. This invitation was sent to you by 'Mike Dempsey'

You have been invited to join the project space 'My Workspace'

Select the following link to start the Lynx client application:

<https://service.a-dato.net/Lynx/Lynx.application>

If this link is not working then you can visit our website at <https://www.a-dato.com> and press the 'Try now' button

You may login to our platform using these credentials:

Username: your.email@yourcompany.com

Password: 73b6a08e

Thanks for your continued support for our platform.

Kind regards,
The A-Dato support team

Регистрация нового пользователя

4

Добро пожаловать в Lync

Введение
Вы запускаете Lync в первый раз. Укажите следующую информацию


Имя	Andrey	Название компании	АРБ
Фамилия	Коп	E-mail	*****@a-r-b.ru
Инициалы	AK	Пароль	●●●●●●
		Повторите ввод пароля	●●●●●●

Сообщайте мне о новых разработках Lync
A-dato иногда отправляет письма с новостями. Эти письма - отличный способ оставаться в курсе событий. Мы никогда не будем передавать вашу личную информацию третьим сторонам.

Не забудьте
ввести **СВОИ**
инициалы!

Вход после регистрации с помощью email и пароля

5

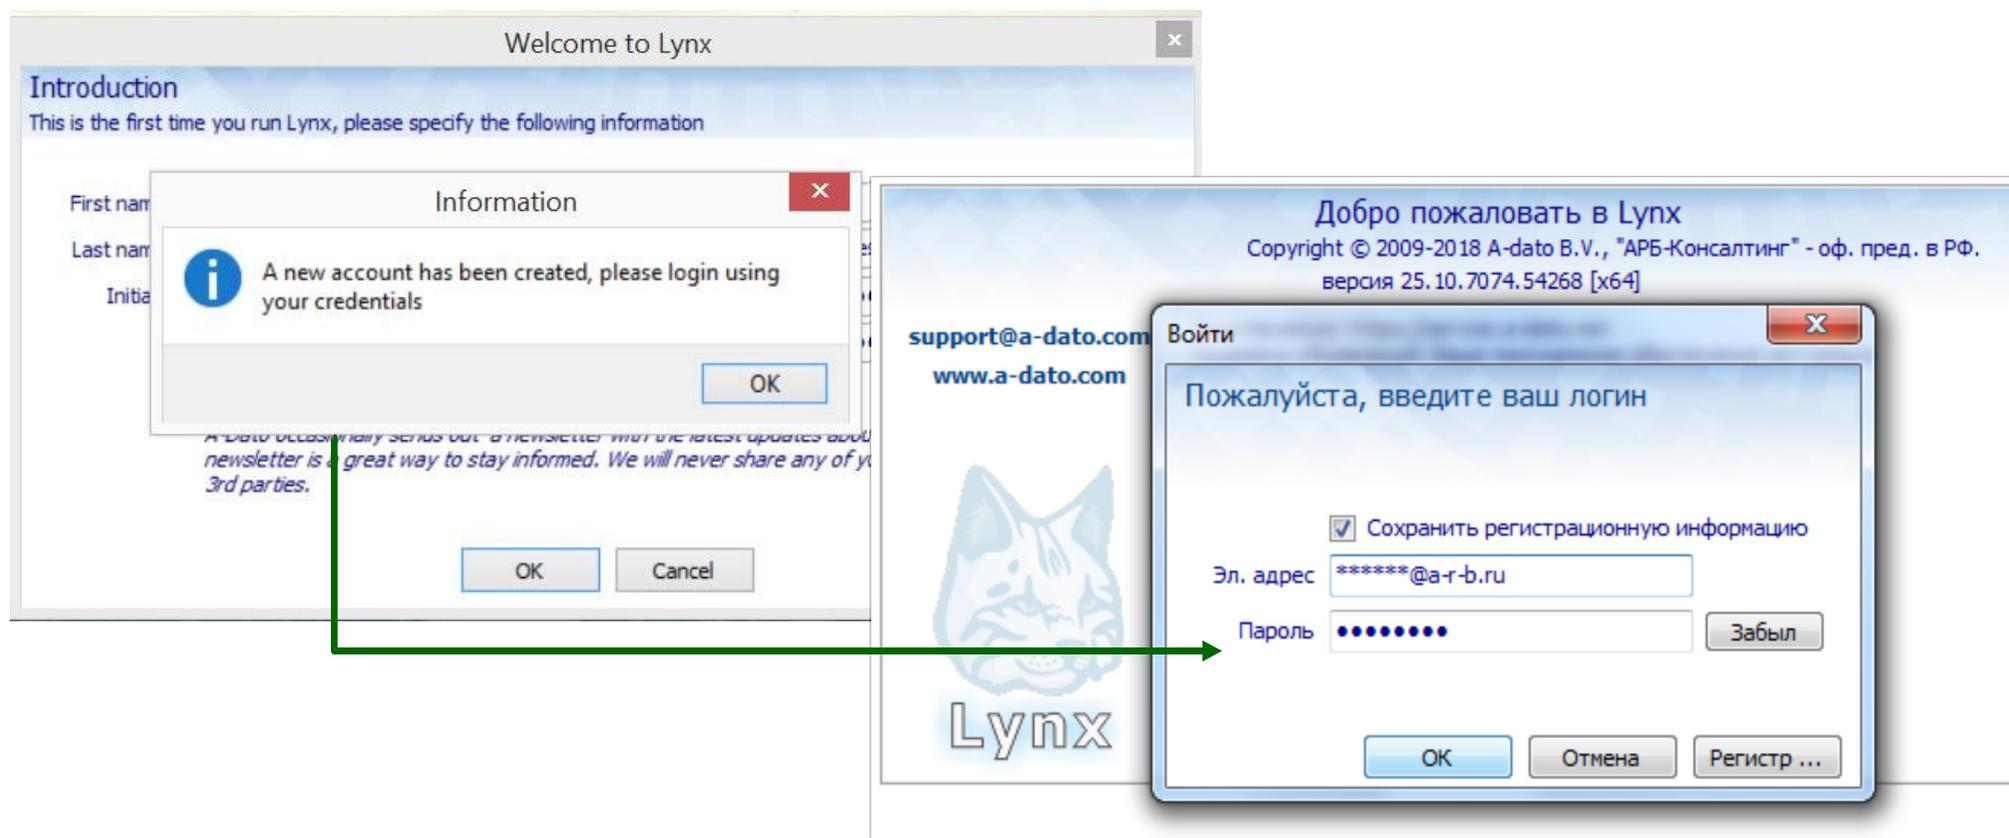

Мои действия

Вкладки «Мои действия» и «Настройки»

The screenshot shows the A-dato web application interface. The top navigation bar includes tabs for "Мои действия", "Сообщения (0)", "Портфель проектов", "Активные задачи", "Календарь", "Настройки", and "Отчеты". The "Мои действия" tab is highlighted with a dashed green box. Below the navigation bar, there is a section for "Показать состав проекта" with a search input and "Карты >>" button. A table with columns "ID", "Описание", "Дата начала", "Менеджер задач", and "Приоритет" is visible. On the right, there is a sidebar with a list of project details including "ID", "Описание", "Проект", "Менеджер проекта", "Запланированные даты", "Ограничение вехи", "Последнее обновление", and "Менеджер задач". At the bottom, there are tabs for "Распределение ресурсов", "Замечания", "Настраиваемые поля", and "Работы".

Для продолжения перейдите на вкладку «Настройки»

Если вы только что зарегистрировались, этот экран будет пуст

Если вы приглашены как новый пользователь, например, на роль Менеджера задач, ваши задачи могут быть уже внесены сюда.

Если вы были приглашены, названия существующих рабочих пространств показываются здесь на вкладках.

Проверка или обновление Моего профиля

7

The screenshot shows a web browser window titled "Andrey Kon, ARB - [Рабочий стол]". The browser's address bar shows "Файл Редакт. Окно Язык Помощь". The main navigation bar includes "Сохранить все", "Открытый", "Свойства", "График прогресса", "Замечания", and "Загрузка ресурса". Below this is a search bar with "Поиск Поиск". The main menu includes "Мои действия", "Сообщения (0)", "Портфель проектов", "Активные задачи", "Календарь", "Настройки", and "Отчеты". The "Настройки" (Settings) tab is active, showing a sidebar with "Личные данные" (Personal data) and "Объекты" (Objects). Under "Личные данные", "Мой профиль" (My profile) is selected. The main content area is titled "Добро пожаловать в Luyx" (Welcome to Luyx) and "Введение" (Introduction). It contains a form with the following fields: "Имя" (Name) with value "Andrey", "Фамилия" (Surname) with value "Kon", "Инициалы" (Initials) with value "AG", "Название компании" (Company name) with value "ARB", and "E-mail" with value "konan@a-r-b.ru". There is a checkbox for "Сообщайте мне о новых разработках Luyx" (Keep me informed of new Luyx developments) which is checked. Below the form is a "Изменить пароль" (Change password) button. Two green callout boxes provide instructions: one points to the "Инициалы" field with the text "Убедитесь, что вы указали свои инициалы!" (Make sure you have entered your initials!), and another points to the "Изменить пароль" button with the text "Здесь вы можете изменить свой пароль" (Here you can change your password).


Убедитесь, что вы указали свои инициалы!

Здесь вы можете изменить свой пароль

Настройки – Базовые настройки

Добавьте Календарь, Навыки и Ресурсы в ваше Рабочее пространство

* Если вас пригласили в существующее рабочее пространство, скорее всего, Календарь, Навыки и Ресурсы в нем уже созданы. Тогда можно пропустить этот шаг.

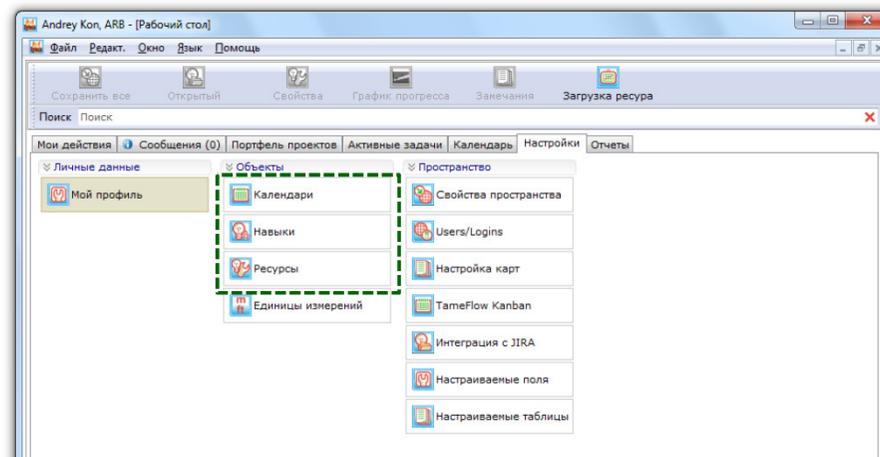

Добавьте ваш стандартный Календарь (1)

9

Выберите **Настройки / Мой профиль / Календари**

Название можно назначить любое

Календарь связан с Проектами, Навыками и Ресурсами. Календарь управляет мощностью или доступностью в терминах времени ресурсов (в часах)

Редактор календаря

Описание
Нажмите «+», чтобы добавить се

Май 2019

	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
18	29	30	1	2	3	4	5
19	6	7	8	9	10	11	12
20	13	14	15	16	17	18	19
21	20	21	22	23	24	25	26
22	27	28	29	30	31	1	2
23	3	4	5	6	7	8	9

Создать новый календарь

Родитель: [выпадающий список]

Название календаря: Новый

ОК Отмена

Интеграция с JIRA
Настраиваемые поля
Настраиваемые таблицы

23 мая 2019 г. 15:38:19

Установите рабочее время (2) и нерабочие дни (3)

10

The screenshot shows the 'Редактор календаря' (Calendar Editor) application. The main window displays a calendar for May 2019. A dialog box titled 'Добавить правило [23.05.2019]' (Add rule [23.05.2019]) is open, showing the 'Нерабочий период' (Non-working period) type. The 'Модель повторения' (Repetition model) is set to 'Каждый воскресенье' (Every Sunday). The 'Диапазон повторяемости' (Repetition range) is set to 'Нет даты нач' (No start date) and 'Нет даты оконч' (No end date). The 'Период' (Period) is set to 'Весь день' (All day). The 'Рабочее время' (Working hours) button is highlighted in green. A second dialog box titled 'Рабочее время' (Working hours) is open, showing a table for entering working intervals. The table has columns 'Начало' (Start) and 'Стоп' (Stop). The first row shows '09:00:00' and '17:00:00'. The 'OK' button is highlighted in green.

Добавим и субботу к нерабочим дням

Установим рабочее время с 9:00 до 17:00

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	
		1 8:00	2 8:00	3 8:00	4 8:00	5 8:00	
6 8:00	7 8:00	8 8:00	9 8:00	10 8:00	11 8:00	12 8:00	
13 8:00	14 8:00	15 8:00	16 8:00	17 8:00	18 8:00	19 8:00	
20 8:00	21 8:00	22 8:00	23 8:00	24 8:00	25 8:00	26 8:00	
27 8:00	28 8:00	29 8:00	30 8:00	31 8:00			
23	3	4	5	6	7	8	9

Начало	Стоп
09:00:00	17:00:00

Стандартный Календарь: Результат

11

Редактор календаря

Вы можете добавить дополнительные календари

В субботу и воскресенье нет рабочих часов

Вы можете добавить доп. выходные дни, например, 1 мая или 1-8 января

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
		1 8:00	2 8:00	3 8:00	4 0:00	5 0:00
6 8:00	7 8:00	8 8:00	9 8:00	10 8:00	11 0:00	12 0:00
13 8:00	14 8:00	15 8:00	16 8:00	17 8:00	18 0:00	19 0:00
20 8:00	21 8:00	22 8:00	23 8:00	24 8:00	25 0:00	26 0:00
27 8:00	28 8:00	29 8:00	30 8:00	31 8:00		


Правила для календаря 'Новый'

- Ресурсы обычно работают между 9:00 и 17:00
- Ресурсы Не работает на воскресенье
- Ресурсы Не работает на суббота

Имеется 2 обновлений

Определите Навыки и их типы («виртуальные» или «нормальные»)

12

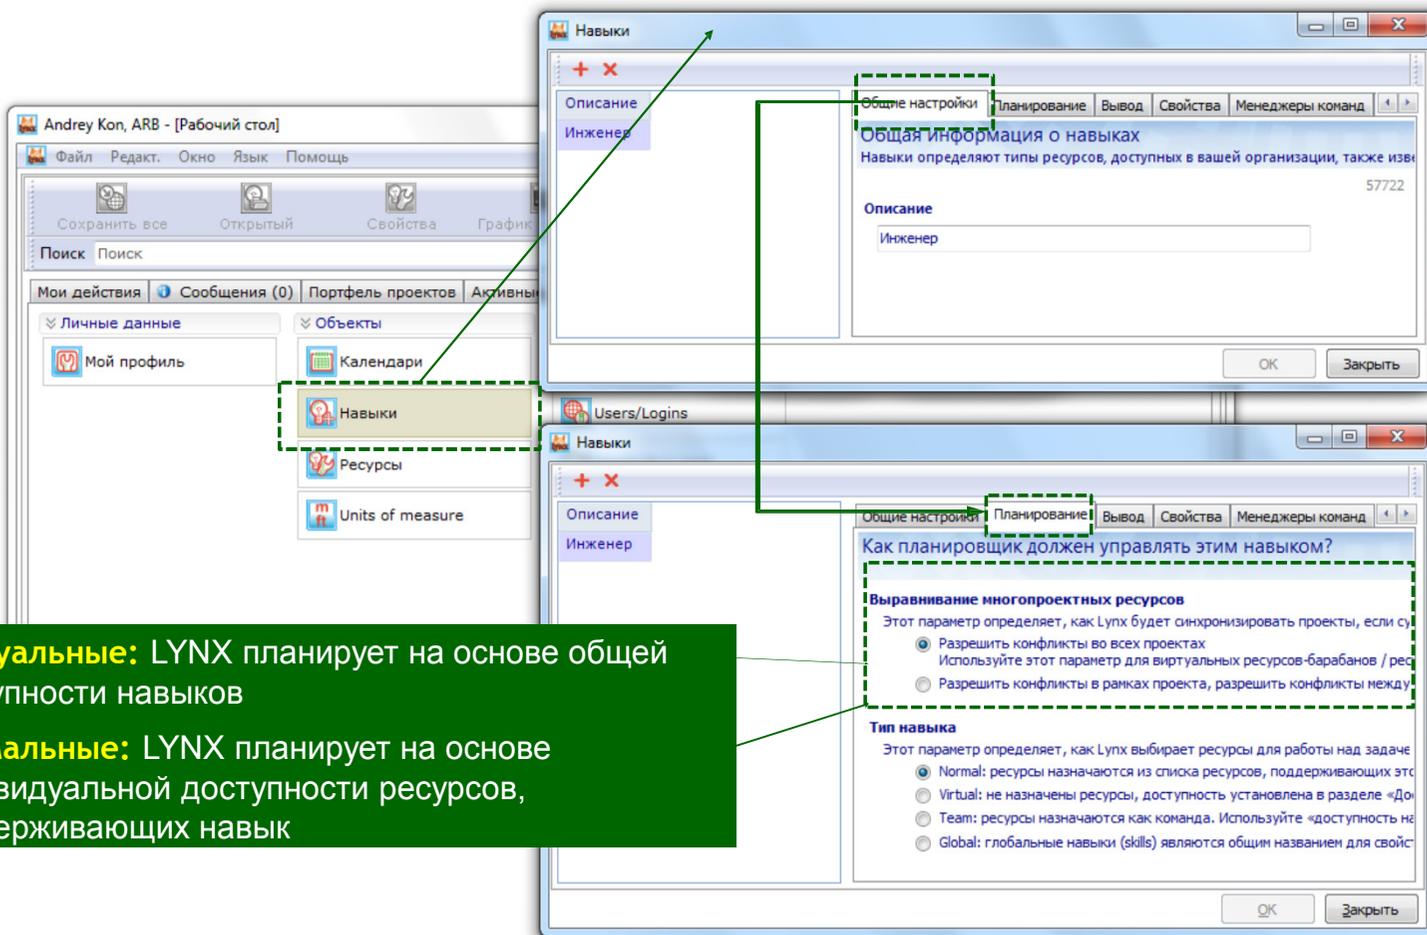


Виртуальные: LYNX планирует на основе общей доступности навыков

Нормальные: LYNX планирует на основе индивидуальной доступности ресурсов, поддерживающих навык

В программе LYNX вы можете работать или только с Виртуальными навыками, или только с Нормальными, или одновременно с обоими. Это зависит от вашего внедрения. Свяжитесь с нами для получения рекомендаций.

Определите ресурсы (нормальные навыки) в Редакторе ресурсов

13

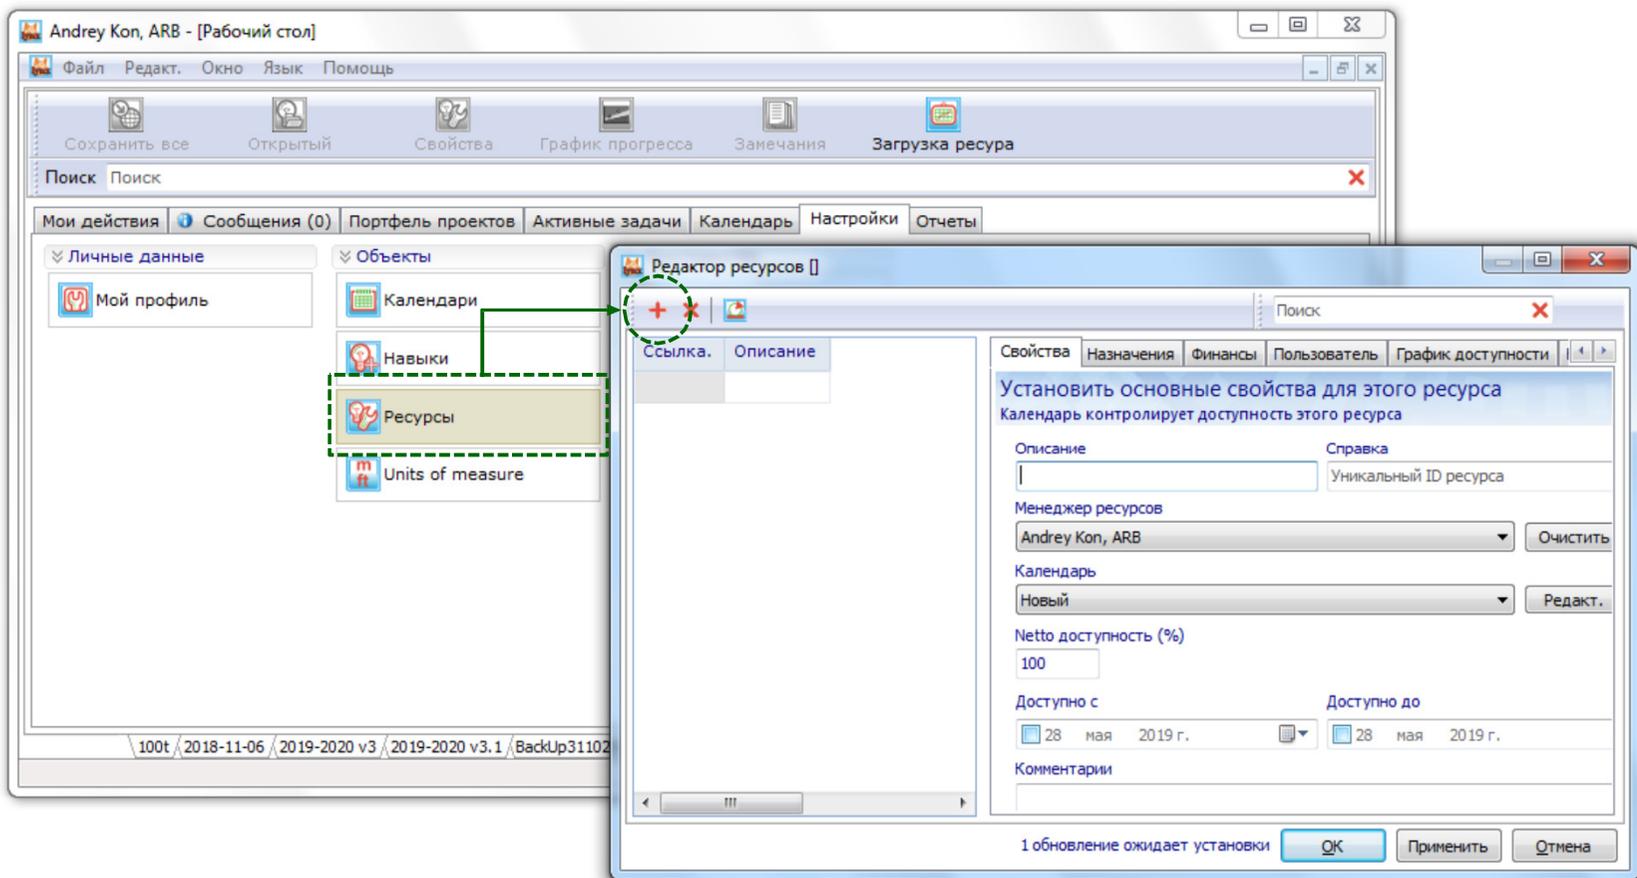



Добавьте навык(и) для ресурса

14

The screenshot shows a software application window titled "Andrey Kon, ARB - [Рабочий стол]". The main window has a menu bar with "Файл", "Редакт.", "Окно", "Язык", and "Помощь". Below the menu bar is a toolbar with icons for "Сохранить все", "Открытый", "Свойства", "График прогресса", "Замечания", and "Загрузка ресурса". A search bar labeled "Поиск" is also present. The main area of the application is divided into sections: "Мои действия", "Сообщения (0)", "Портфель проектов", "Активные задачи", "Календарь", "Настройки", and "Отчеты". On the left side, there are two panels: "Личные данные" with "Мой профиль" and "Объекты" with "Календари", "Навыки", "Ресурсы", and "Units of measure". The "Ресурсы" item is highlighted with a green dashed box. In the foreground, a "Редактор ресурсов" window is open. It has a search bar and a table with columns "Ссылка" and "Описание". Below the table, there are tabs: "Финансы", "Пользователь", "График доступности", "Навыки", and "Значения свойств". The "Навыки" tab is selected. The main content area of the "Редактор ресурсов" window contains the text: "Добавить, редактировать или удалить навыки для выбранного ресурса. Навыки используются для определения возможностей ресурса." Below this text, there are two lists: "Доступные навыки" and "Назначенные навыки". The "Назначенные навыки" list contains the item "Инженер". A green dashed box highlights the right arrow button (>>) between the two lists, indicating the action of adding a skill. A green callout box with the text "Andrey Kon теперь инженер" (Andrey Kon is now an engineer) is positioned next to the "Инженер" item in the "Назначенные навыки" list. At the bottom of the "Редактор ресурсов" window, there are buttons for "ОК", "Применить", and "Закрыть".

Добавьте другие (виртуальные) навыки и ресурсы

15

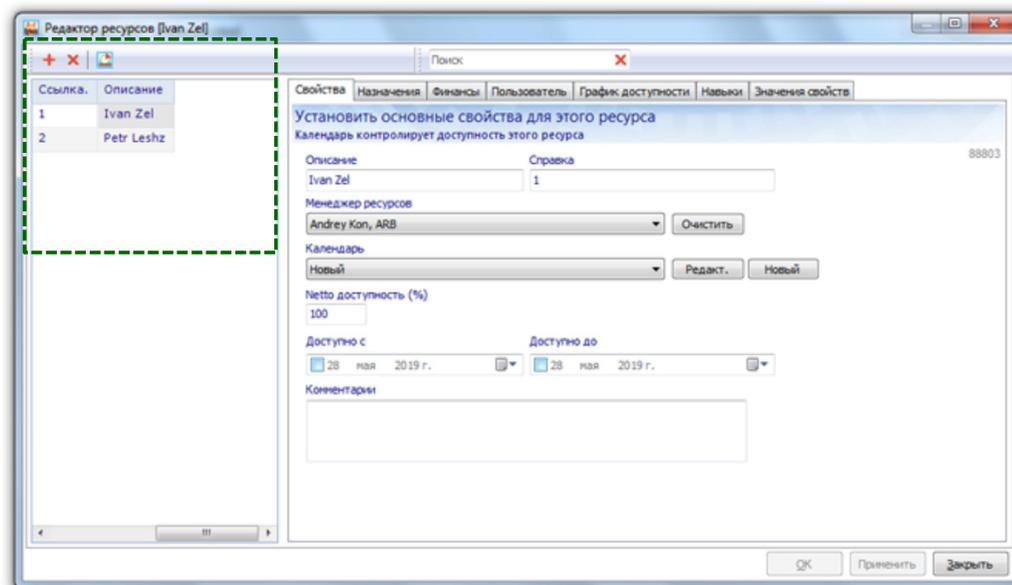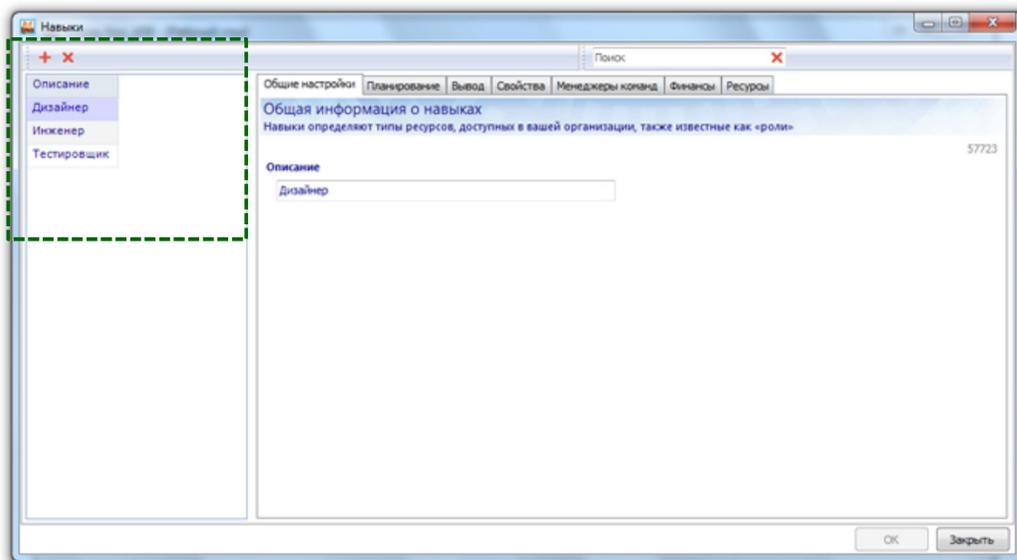

Навыки	Доступность	Ресурсы
Дизайнер	1	Ivan Zel
Инженер	2	Andrey Kon, Petr Leshz
Тестировщик	1	Petr Leshz

Создайте первый проект

Добавьте свой первый проект

Выберите вкладку
Портфель проектов в
окне (F5)

Выберите **Добавить**

1

Введите название
проекта

2

Введите первоначальную
ожидаемую дату
завершения

3

Убедитесь, что
установлен флажок
**Использовать механизм
CCPM.**

Установите свои
предпочтения.

Сохранить все Открытый **Добавить** Удал. Свойства График прогресса Занесения Загрузка ресурса

Поиск Статус: Активный

Мои действия Сообщения (0) Портфель проектов Активные задачи Календарь Настройки Отчеты

Шаблоны Показать все Черновики Активный Временной график

ID Ссылка. Приоритет Описание Менеджер проекта Статус Начало Конец Ожидаемое оконча Представление

Свойства проекта

Шаблон Общие настройки Настраиваемые поля Даты проекта Планирование Доступность ресурсов

Запланировать этот проект?

Модуль планирования

- «Как можно быстрее»
- «Как можно быстрее» - планирование задач вперед с даты начала проекта
- «Точно в срок»
- «Точно в срок» - планирование задач назад с даты окончания проекта
- Использовать механизм CCPM**
- CCPM - решение для управления проектами на основе теории ограничений
- Запланировать питающие цепи «Как можно быстрее»
- Запланировать питающие цепи «Точно в срок»

Перепланировать поведение для проектов, содержащих информацию о ходе работы

- Если статус установлен на «не запущен», запланируйте п
- Если статус установлен на «не запущен», запланируйте п

Многопроектное поведение

- Задачи должны быть запланированы последовательно
- Разбивать задачи для оптимизации ресурсов

Выравнивание нагрузки ресурсов

- Автоматическая балансировка ресурсов на основе их дос

Сохранить проект как шаблон

OK Отмена

Ваш первый проект появился в Портфеле / Статус «Черновик»

19

Проекты удобно просматривать с помощью фильтров

Фильтры по умолчанию:

- Черновик
- Активный
- Показать все
- Шаблоны

Открыть Проект

Сбросить фильтр

Ваш первый проект (D1) был создан и показывается в Портфеле проектов со статусом «Черновик»

Фича: Если кликнуть правой кнопкой мыши на заголовке столбца, появятся доп. сортировки и фильтры

ID	Ссылка.	Приоритет	Описание	Менеджер проекта	Статус	Начало	Конец	Ожидаемое окончание	CCPM	Представление
001		4	D1 Product Development	AG	Черновик	Вт 28 май	Вс 1 сен		n/a	n/a

Sort smallest to largest
Sort largest to smallest
Clear filter
Clear all (sort+filters)
Hide column
Add column after...
MD
enter your search text
OK Cancel

Окно Проекта – множество вкладок и окон

Рабочее окно проекта D1

Меню:

- Вид Ганта (Alt+F5)
- Представление ввода данных (Alt+F6)
- Просмотр карт (Alt+F9)
- Другие окна
 - Перейти на рабочий стол (F5)
 - Открыть редактор календаря (F6)
 - Открыть редактор навыков (F7)
 - Редактор открытых ресурсов (F8)
- Окно ресурсов / навыков
- Окно статистики проекта
- Окно свойства задачи
- Окно сообщений

Кликните на область **Диаграммы Ганта**, чтобы увидеть обновления в **Сетке Задач** и **Свойствах Задач**! *

Сетка Задач

Свойства Задач

Диаграмма Ганта

Свойство	Ценность
Начало проекта	Вт 28 май
Расчетное начало	
Расчетное завершение	
Срок завершения	Вс 1 сен
Показатель срока завершения	В срок
Кратчайший путь	
Критическая цепь	
Разрыв критической цепи	
Буфер проекта	Нет
Время ресурса	0h
Осталось	0h

Статистика | Навыки | Ресурсы | Менеджеры

Свойства задачи:

- Длительность: []
- ЕТТС: []
- Приоритет: []
- Тип задачи: []
- Общие настройки: []
- Автоматическое заполнение: []
- Обновлено: н/д
- Автоматическое расширение: []
- Свернуть: []
- Фиксированная длительность: []
- На критической цепи?: []

28 мая 2019 г. 15:10:35

Создайте План проекта

21

- Добавьте задачи
- Создайте сеть проекта
 - Добавьте зависимости между задачами (предшественник / наследники)
- Добавьте (виртуальные) Навыки (и Ресурсы)
- Конвертируйте План в План Критической цепи

Добавьте задачи

22

The image shows two overlapping screenshots of a project management application. The left screenshot shows a Gantt chart with a message: "Проект не содержит данных (добавить задачу)". A green callout box points to this message with the text "Создайте свою первую задачу здесь". Another green callout box points to the Gantt chart area with the text "Зеленая линия = СЕГОДНЯ". The right screenshot shows the task configuration dialog for "First task". A green callout box points to the "Длительность" (Duration) field, which is set to "5 День", with the text "Длительность всех новых задач по умолчанию – 1 день. Вы можете изменить ожидаемую длительность задач в этом столбце." Another green callout box points to a "CLICK HERE" button on the Gantt chart with the text "Кликните на Диаграмме Ганта чтобы подтвердить свои изменения! *".

* Это сделано для оптимизации производительности и предотвращения того, что любое (небольшое) изменение вызывает пересчет полного (большого) плана проекта.

Добавьте больше задач

23

Чтобы добавить новую задачу, кликните **+**. Как видно из выпадающего списка, задачу можно добавить и с помощью комбинации клавиш (Ctrl+Insert).

Удалить задачу X

CLICK HERE

Кликните здесь, чтобы подтвердить свои изменения

Используйте клавишу Стрелка вниз, чтобы быстро добавить новую строку

#	ID	Имя	Разм...	Дл	СС	Тип задачи	Состояние	Параметры
1	001-T1	First task						
2		Task 2		[1 День]	Черновик	As soon as possible		
3		Task 3		[1 День]	Черновик	As soon as possible		
4		Task 4		[1 День]	Черновик	As soon as possible		
5				[1 День]	Черновик	As soon as possible		

Вставить задачу

28 мая 2019 г. 16:29:41

Задачи 2-5 относятся к питающим цепям, они не лежат на Критической цепи.

В этом примере питающие цепи позиционируются как «Точно-в-Срок», выравнивание относительно Критической цепи (Задача 1).

Добавьте зависимости между задачами

24

Кнопка для установки зависимости между задачами (просто кликните на эту кнопку, не открывайте выпадающее меню). По умолчанию, это зависимость Финиш-Старт.

В выпадающем меню доступны и другие типы зависимости. Но в ССРМ обычно используется только Финиш-Старт.

Задачи 1 и 2 выбраны, чтобы задать зависимости. Используйте **SHIFT** или **CTRL** для выбора нескольких задач

Между задачами 1 и 2 зависимость Финиш-Старт.

#	ID	Имя	Разм...	Длительность...	Статус	Сроки
1	001-T1	First task		[5 дней]	Черновик	As soon as possible
2	001-T2	Task 2		[4 дней]	Черновик	As soon as possible
3	001-T3	Task 3		[4 дней]	Черновик	As soon as possible
4	001-T4	Task 4		[3 дней]	Черновик	As soon as possible
5	001-T5	Task 5		[5 дней]	Черновик	As soon as possible

Добавить отношения предшественника между выбранными задачами

29 мая 2019 г. 10:35:27

Также выберите Задачи с помощью мыши в Диаграмме Гантта, чтобы добавить зависимости

25

The screenshot shows a software interface for project management. At the top, there is a menu bar with options like 'Файл', 'Редакт.', 'Посмотреть', 'Проект', 'Окно', 'Язык', and 'Помощь'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Сохранить', 'Просмотр карт', 'Распечатать', 'Загрузка ресурса', 'Выпуск', and 'Свойства'. A search bar is on the right. The main area is divided into a table on the left and a Gantt chart on the right. The table lists tasks with columns for ID, Name, Duration, and Status. The Gantt chart shows a timeline from May 28, 2019, to June 17, 2019, with task bars and dependency arrows. A green dashed box highlights a task in the Gantt chart. A green callout box contains the text: 'Зависимости будут идти от задачи, выбранной первой, к следующей выбранной задаче (задачам)'. At the bottom, there is a task details panel for 'Task 5' with various settings like 'Длительность', 'ETTC', 'Приоритет', and 'Тип задачи'. The status is set to 'Черновик'.

#	ID	Имя	Разм...	Длительность...	Статус	Ассигн.
1	001-T1	First task		[5 дней]	Черновик	As...
2	001-T2	Task 2		[4 дней]	Черновик	As...
3	001-T3	Task 3		[4 дней]	Черновик	As...
4	001-T4	Task 4		[3 дней]	Черновик	As...
5	001-T5	Task 5		[5 дней]	Черновик	As...
6		Task 6		[3 дней]	Черновик	As...

Зависимости будут идти от задачи, выбранной первой, к следующей выбранной задаче (задачам)

Рассмотрите результаты и статистику

26

Используйте автоматмасштабирование (F4), чтобы ваш план поместился в окно Диаграммы Ганта

Свойства и зависимости для Задачи 2

Текущая длина Критической цепи 17 дней

Статистика проекта отображается здесь

Статус задачи: **Тартовая группа**

- Черновик
- Запущен
- Завершен
- Приостановлен
- Прерван

Готов к запуску?

Свойство	Ценность
Начало проекта	Ср 29 май
Расчетное начало	Ср 29 май 9:00
Расчетное завершение	Чт 20 июн 17:00
Срок завершения	Вс 1 сен
Показатель срока завершения	В срок
Кратчайший путь	17 дней
Критическая цепь	17 дней
Разрыв критической цепи	
Буфер проекта	Нет
Время ресурса	

Отношения предшественника (Редакт.)				Наследственные отношения (Редакт.)			
#	Предшественник	Связь	Отставание	#	Преемник	Связь	Отставание
4	First task	Finish -> Start		5	Task 5	Finish -> Start	

29 мая 2019 г. 11:14:53

Добавьте Навыки (и Ресурсы)

27

2 Просто перетащите Навык в выделенные задачи (1 или несколько)

1 Выберите окно «Навыки/Ресурсы/Менеджер задач»

Навык «Дизайнер» будет добавлен в Задачу 4

Навыки	Доступность	Ресурсы
Дизайнер	1	Ivan Zel
Инженер	2	Andrey Kon, Petr Leshz
Тестировщик	1	Petr Leshz

Используйте drag & drop для назначения выбранных навыков задачам, отображаемым в

Рассмотрите требования к Ресурсам Свойства Задачи

The screenshot displays a project management application window titled "Andrey Kon, ARB - [D1 Product Development]". The main view is a Gantt chart showing task dependencies. Task 4, "First task", is highlighted with a green dashed box. A green callout box points to its duration, which is shown as "[5 дней]". Another green callout box points to the resource requirements for Task 1, "Task 2", which are listed as "S: Инженер [*Petr Leshz:40h]" and "S: Дизайнер [*Ivan Zel:40h]". A third green callout box points to the "Requirements for resources" tab in the task details panel, which shows the same resource requirements. A fourth green callout box points to the "Critical Path" (Критическая цепь) in the task details panel, which is highlighted with a green dashed box and shows a duration of 21 days. The task details panel also shows the task status as "Черновик" (Draft) and "Готов к запуску?" (Ready for launch?).


Когда Навыки добавлены к Задаче, длительность показана в скобках [5 дней]. Ожидаемое время может быть изменено только **здесь**

Задача 1 лежит на Критической цепи и готова к старту (RTS)

Длина Критической цепи сейчас 21 день, пока есть конкуренция за ресурс (4 дня) с навыком «Дизайнер». Увидеть причину конкуренции и в какой задаче она существует, можно на вкладке «Конфликт ресурсов»

Рассмотрите загрузку ресурсов для проекта

29

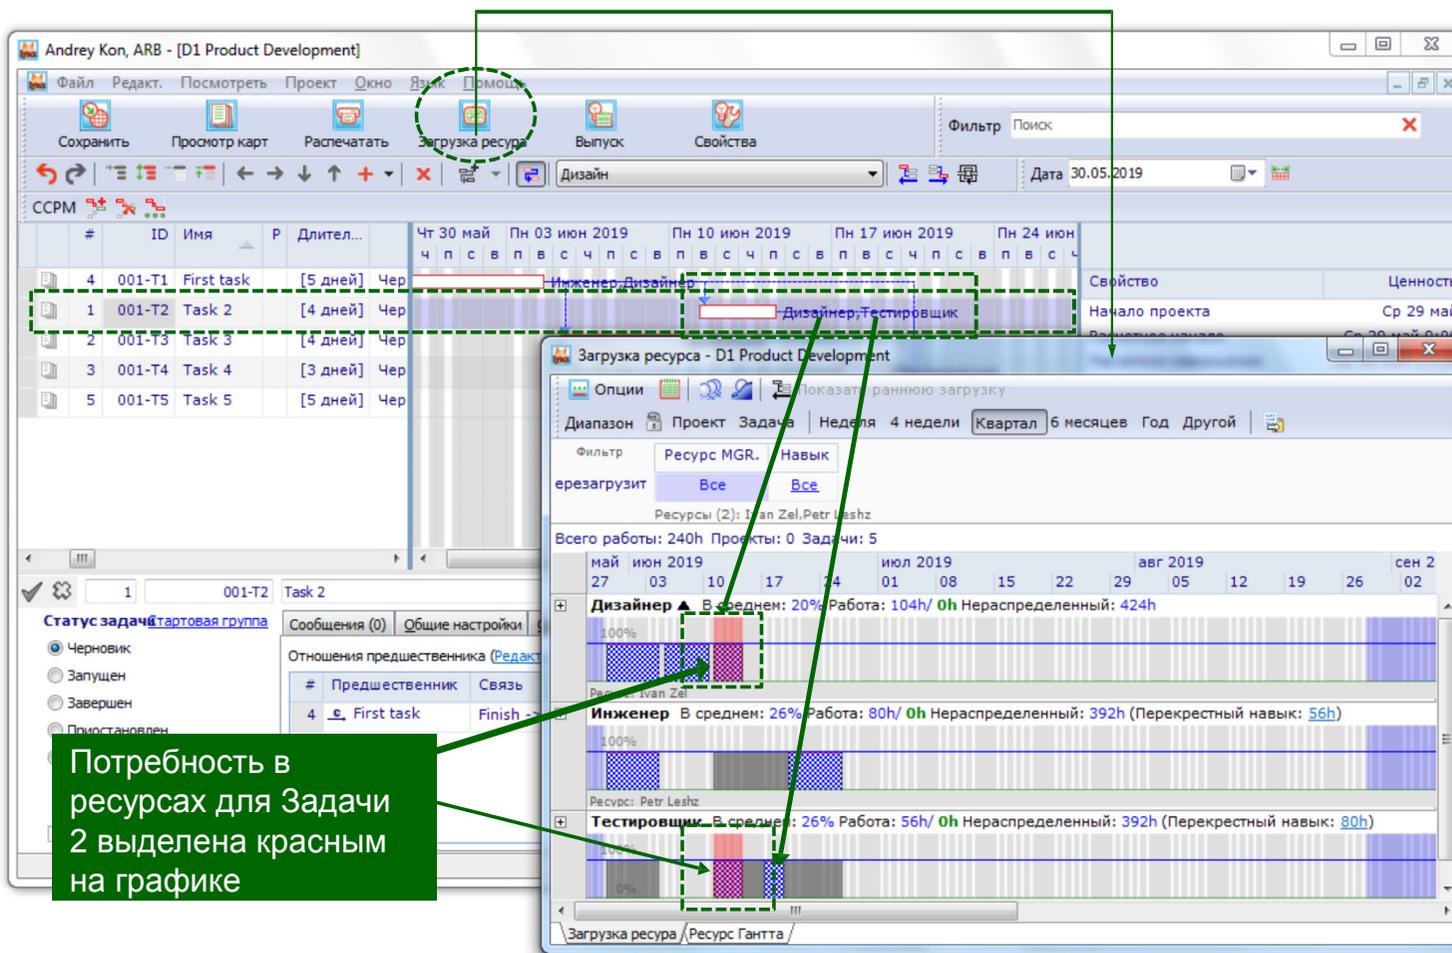

Рассмотрите загрузку ресурсов для вашего проекта (Виртуальные навыки)

30

The screenshot displays two overlapping windows from a project management application. The left window, titled 'Andrey Kon, ARB - [D1 Product Development]', shows a task list with columns for ID, Name, Duration, and Status. A green dashed box highlights the second task, '001-T2 Task 2'. The right window, titled 'Загрузка ресурса - D1 Product Development', shows a resource loading chart for 'Ivan Zel, Petr Leshz'. It includes a Gantt chart and a table of resource requirements.

Resource / Skill	Duration	Percentage	Status
S: Дизайнер [*Ivan Zel:32h]	4 дней/32h	100%	Черновик
S: Тестировщик [*Petr Leshz:32h]	4 дней/32h	100%	Черновик

Additional text in the bottom right of the resource loading window: 'Команда не может быть установлена, навык - это не' and 'Обновлено: Ср 29 май 11:39 вами'. The system clock at the bottom indicates '29 мая 2019 г. 12:32:24'.

В случае Виртуальных навыков, LYNX не делает предварительный выбор и мягко распределяет по названию ресурса. Смотрите Слайд 12

Добавьте настройки Критической цепи в 3 шага

Настройки по сокращению времени задачи

1

#	ID	Имя	Р	Длительность
4	001-T1	First task		[2,5 д...]
1	001-T2	Task 2		[2 дней]
2	001-T3	Task 3		[2 дней]
3	001-T4	Task 4	[3 дней]	Чер
5	001-T5	Task 5	[5 дней]	Чер

2

3

Свойства проекта

Общие настройки | Настраиваемые поля | Даты проекта | Планирование | Доступность ресурсов | Критическая цель

Управление проектами в критической цепи
Настроить параметры CCPM

Автоматически обнаруживать и отмечать задачи на критической цепи

Автоматически сокращать срок выполнения задачи

Сократить длительность в (%)

Создание буфера

Питающий буфер(ы) (%) Потребление питающих буферов, если они продлевают длительность СС

Буфер(ы) вехи (%) Потребление буферов вехи, если они продлевают длительность СС

Буфер проекта (%) Вставить буферы

Выполнение проекта

Ожидаем потребление буфера (%)

Сохранить проект как шаблон

OK Отмена

Вы можете оставить проценты по умолчанию

Пересчитать буферы

Какие буферы вы хотите создать?

настройки | Результаты

Вставить питающие буферы

Размер питающего буфера (%)

Потребление питающих буферов, если они продлевают длительность СС

Вставить буферы вехи

Размер буфера вехи (%)

Потребление буферов вехи, если они продлевают длительность СС

Минимальный уровень буфера (%)

Вставить буферы проекта

Размер буфера проекта (%)

Создать буферы

Закрывать

Andrey Kon, ARB - [D1 Product Development]

Файл | Редакт. | Посмотреть | Проект | Окно | Дзык | Помощь

Сохранить | Просмотр карт | Распечатать | Загрузка ресурса | Выпуск | Свойства

Фильтр | Поиск

Дата 29.05.2019

CCPM

#	ID	Имя	Р	Длительность	Ср 29 май 2019	Пн 03 июн 2019	Пн 10 июн 2019
4	001-T1	First task		[2,5 д...]			
1	001-T2	Task 2		[2 дней]			
2	001-T3	Task 3		[2 дней]			
3	001-T4	Task 4	[1,5 д...]				
5	001-T5	Task 5	[2,5 д...]				
6		Буфер проекта	[6 дней]				

Инженер, Дизайнер | Дизайнер, Тестировщик | Дизайнер | Тестировщик | Инженер

Свойство | Ценность

Начало проекта | Ср 29 май

Расчетное начало | Ср 29 май 9:00

Расчетное завершение | Ср 12 июн 13:00

Срок завершения | Вс 1 сен

Показатель срока завершения | В срок

Кратчайший путь | 8,5 дней

Критическая цепь | 10,5 дней

Разрыв критической цепи

Буфер проекта | 6 дней

3

расчетное завершение	Ср 29 июн 17:00
Срок завершения	Вс 1 сен
Показатель срока завершения	В срок
Кратчайший путь	17 дней
Критическая цепь	21 дней

Длина Критической цепи будет сокращена на 50%. Было – 21 день. Стало – 10,5 дней.

Запустите свой проект

Создайте активные задачи

Запустите свой проект и создайте активные задачи

The image shows the LYNX project management software interface. The main window displays a Gantt chart with tasks and resources. A 'Свойства' (Properties) dialog box is open, showing the 'Общие свойства проекта' (General project properties) tab. The 'Статус' (Status) dropdown menu is open, showing 'Активный' (Active) as the selected option. A green box highlights the 'Активный' option in the dropdown menu. A green box also highlights the 'Свойства' button in the main window. A green box highlights the 'Статус' dropdown menu in the 'Свойства' dialog box. A green box highlights the 'Статус' dropdown menu in the 'Свойства' dialog box. A green box highlights the 'Статус' dropdown menu in the 'Свойства' dialog box.

Выберите в свойствах проекта «Активный»

2

1

3

Запуск проекта приведет к обновлению и расширению статистики

После запуска проекта, LYNX создаст 2 новых столбца для управления буфером (буфера проекта и питающего буфера)

Свойство	Целевое значение
Начало проекта	Ср 29 май 14:06
Расчетное начало	Ср 29 май 9:00
Планируемое завершение	Ср 12 июн 13:00
Фактическое завершение	Вс 1 сен
Показатель срока завершения	57,5 дней Рано
Кратчайший путь	8,5 дней
Ожидаемое окончание	Ср 19 июн 15:00
Критическая цепь	10,5 дней
Буфер проекта	6 дней
Текущая самая длинная цепь	10,5 дней
Самая длинная цепь.	0%
Текущий самый длинный разрыв цепи	
Критический буфер	Буфер проекта
Потреблено буфера	0%
Питающая цепь	10,5 дней
Завершение питающей цепи.	0%
Время ресурса	120h
Осталось	120h

Добавьте Менеджера задач (пригласите самого себя, например) В CCPM Менеджер задач обычно отвечает за обновление прогресса

34

Andrey Kon, ARB - [D1 Product Development]

Файл Редакт. Посмотреть Проект Окно Язык Помощь

Сохранить Просмотр карт Распечатать Загрузка ресурса Свойства

Фильтр Поиск

Дата 27.05.2019

Теги 0 - Вт 28 май 14:04

#	ID	Буферы	ма	июн 2019	июл 2019	авг 2019	сен 2
4	001-T1	First task	0%	n/a	Инженер, Дизайнер		
1	001-T2	Task 2	0%	n/a	Дизайнер, Тестировщик		
2	001-T3	Task 3	0%	n/a	Дизайнер		
3	001-T4	Task 4	0%	n/a	Инженер		
5	001-T5	Task 5	0%	n/a	Инженер		
6		Буфер проекта	0%	n/a			

Инвайт

Предложить пользователям разделить данные с вами
Поделиться проектом 'D1 Product Development' со следующим пользователем

Пригласить существующего пользователя

Andrey Kon, ARB

Пригласить нового пользователя

Введите действительный e-mail

Поделиться проектом с пользователем:

Предоставить пользователю права только на чтение

Предоставить пользователю права на чтение и запись

Инвайт Отмена

Статистика | Навыки | Ресурсы | Менеджеры задач | Конфл

Добавьте Менеджера задач в список менеджеров для этого проекта

Пригласите менеджера для Задачи 1

Один Менеджер задач (вы) был добавлен в Задачи 1 и 4

Сохраните изменения

Файл Редакт... тошь
Сохранить Просмотр карт Распечатать Загрузка ресурса Свойства
Фильтр Поиск
Дата 27.05.2019
Теги 0 - Вт 28 май 14:04
Просмотр планирования

#	ID	Буферы	ма	июн 2019	июл 2019	авг 2019	сен
4	001-T1	First task	27	03 10 17 24	01 08 15 22	29 05 12 19 26	02
1	001-T2	Task 2					
2	001-T3	Task 3					
3	001-T4	Task 4					
5	001-T5	Task 5					
6	001-T6	Буфер проекта					

Инвайт Поиск
Andrey Kon, ARB

Статистика | Навыки | Ресурсы | Менеджеры за...

4 001-T1 First task

Статус задачи: **Стартовая группа**

- Черновик
- Запущен
- Завершен
- Приостановлен
- Прерван

Готов к запуску?

Сообщения (0) **Общие настройки** Ограничение Даты Требования к ресурсам Зависимости Настраиваемые поля Вид Отслеживание Пакет работ

Длительность [2,5 дней] Автоматическое заполнение
Обновлено: н/д
ЕПТС Автоматическое расширение
Приоритет 500 Свернуть
Тип задачи Нормальный Фиксированная длительность
 Задача критической цепи?
 На самой длинной текущей цепи?

Менеджер задач
Andrey Kon, ARB

Andrey Kon был добавлен с помощью перетаскивания в Задачи 1 и 4

29 мая 2019 г. 14:45:49

Выберите закладку Мои действия

Обновите ожидаемое время завершения (ЕТТС) для вашей первой задачи

36

1

2

3

Теперь вы можете обновить прогресс → смотрите Руководство для Менеджера задач

ID	Описание	Дата начала	Менеджер...	Приоритет	RTS	Рес
001-T1	First task D1 Product Development	Ср 29 май 9:00 [w22]	AG	●	Да	Дизайнер [2,5 Инженер [2,5 д

Детали задачи

ID 001-T1
Описание First task
Проект D1 Product Development
Менеджер проекта Andrey Kon, ARB
Запланированные даты Ср 29 май 9:00 - Пт 31 май 13:00
Ограничение вехи п/а
Последнее обновление Ср 29 май 14:45 в Andrey Kon
Менеджер задач Andrey Kon, ARB

Распределение ресурсов Примечания (0) Рабочее время

Обновить все ресурсы:

Статус Черновик

ЕТТС 2,5 дней/20h
Введите «ожидаемое время завершения» этой задачи

Дизайнер

Ваша роль Ресурс Ivan Zel
Навык Дизайнер
Ресурсы *Ivan Zel
Статус Черновик

Несколько советов и трюков

Дополнительная информация

См. также:

<http://www.a-dato.com/get-started/info-kit/>

Несколько советов и трюков



38

Используйте правую кнопку мыши, чтобы установить фильтры и скрыть столбцы

Кликните на линейке дат левой кнопкой мыши и, не отпуская кнопку, тяните линейку вправо или влево для масштабирования

Для копирования фрагментов в области задач используйте комбинации клавиш **CTRL+C** (копировать) и **CTRL+V** (вставить)

Кликните на Диаграмме Гантта и затем используйте клавишу CTRL вместе с колесом прокрутки мыши для масштабирования

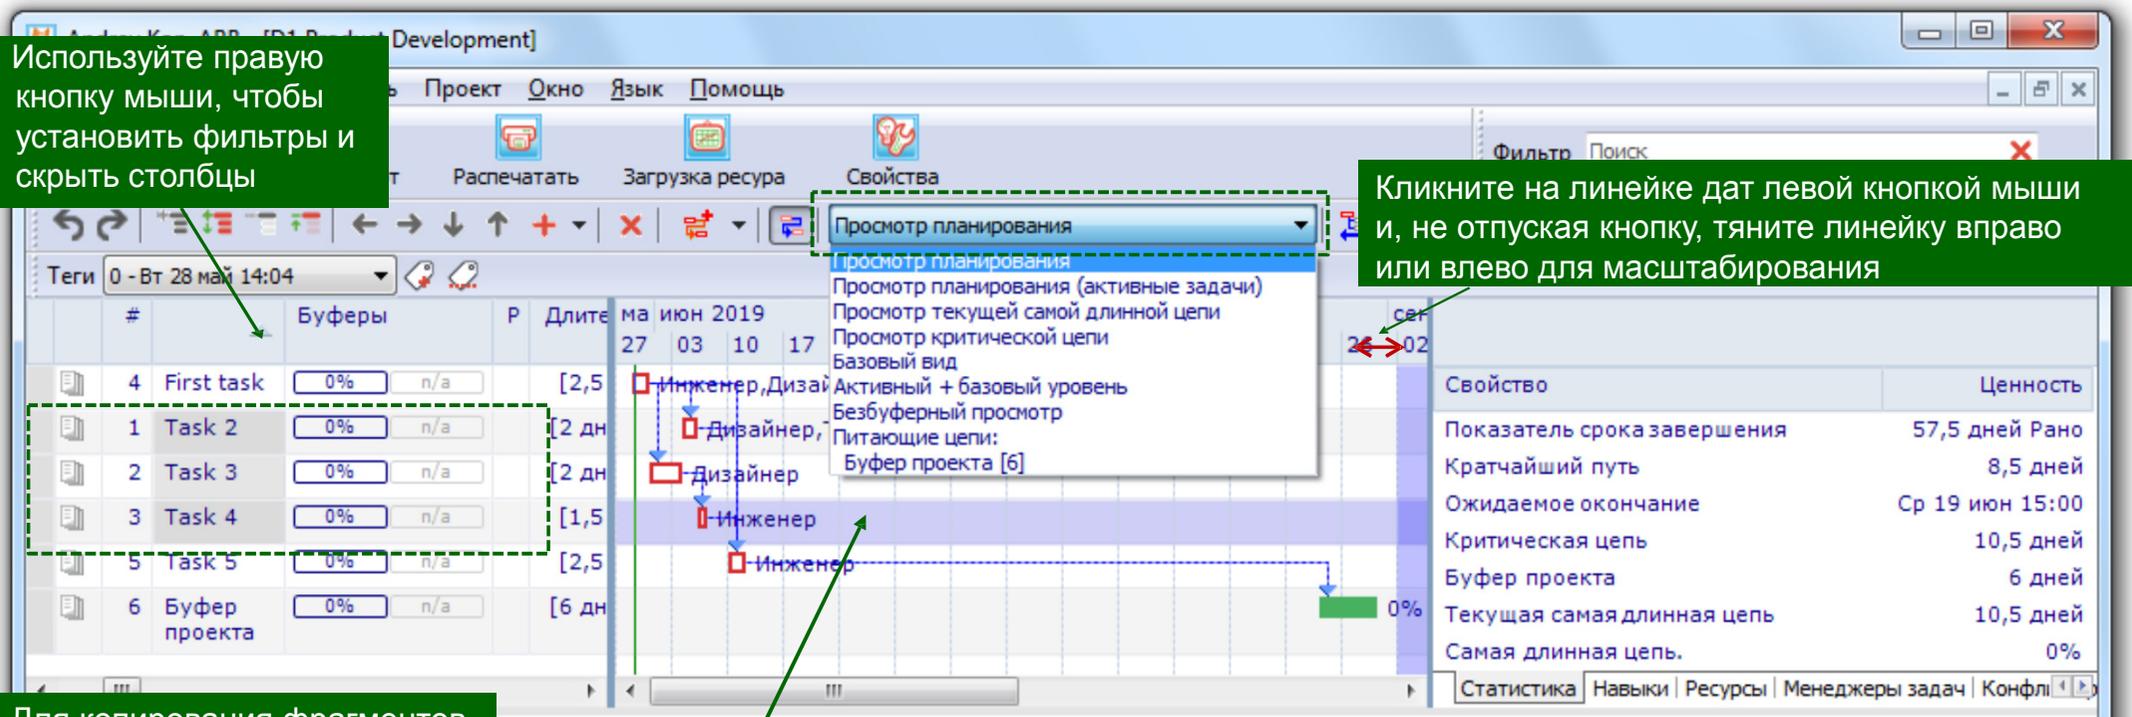

Если вы получили сообщения с предупреждением, что план не может быть рассчитан из-за нарушения логики планирования

В этом проекте доступен только один дизайнер. Но планировщик назначил двоих!

LYNX не может пересчитать проект, пока имеются предупреждения

Сообщения с предупреждением (1) показаны во вкладке «Сообщения»

Сообщение: Комбинация требований к ресурсам возвращает неправильную комбинацию ресурсов.

Статус задачи: [тарговая рывна](#)

- Черновик
- Запущен
- Завершен
- Приостановлен
- Прерван

Готов к запуску?

29 мая 2019 г. 15:54:44

Как добавить «Примечания»

40

1

Кликните на эту иконку, чтобы добавить Примечание

2

Выберите из списка подходящий тип Примечания

3

Пишите здесь

Andrey Kon, ARB - [D1 Product Development]

Файл Редакт. Посмотреть Проект Окно Язык Помощь

Сохранить Просмотр карт Распечатать Загрузка ресурса Свойства

Просмотр планирования

Теги 0 - Вт 28 май 14:04

#	Буферы	Р	Длительность	Исполнитель
4	First task	0%	[2,5]	Инженер, Дизайнер
1	Task 2	0%	[2 дн]	Дизайнер, Тестировщик
2	Task 3	0%	[2 дн]	Дизайнер
3	Task 4	0%	[1,5]	Инженер
5	Task 5	0%	[2,5]	Инженер
6	Буфер	0%	[6 дн]	

Детали задачи

Поиск

Фильтр: Показать все

Проблема Andrey Kon, ARB Ср 29 май 15:15

Проблема: Надо сменить дизайнера!

Тип Проблема

- Комментарий
- Проблема
- Начать проверку
- Проверка окончания
- Восстановление буфера
- Изменение приоритета

Введите предлагаемое решение проблемы здесь

Статус задачи: стартовая группа

- Черновик
- Запущен
- Завершен
- Приостановлен
- Прерван

Сообщения (0) Общие настройки Ограничение Даты Требования к ресурсу

Длительность [2,5 дней] Автоматическое заполнение Обновлено: н/д

ЕТТС

Приоритет 500 Автоматическое расширение

Тип задачи Нормальный Свернуть

Фиксированная длительность

Задача критической цепи?

На самой длинной текущей

Готов к запуску?

29 мая 2019 г. 15:18:00

Продолжение

41

Каждое окно можно двигать независимо. Можно использовать 2 экрана одновременно




Правый клик мыши на строке проекта

Уберите отметку «Использовать механизм CCPM», чтобы использовать LYNX Load Factor Scheduling

Вы можете запланировать классический проект без CCPM с помощью LYNX Load Factor Scheduling

ID	Ссылка	Приоритет	Описание
001		4	D1 Product Development

LYNX был тщательно протестирован, но если вдруг вы увидите такое...
Если вы получили сообщение об ошибке, переправьте это сообщение нам



Send Assistant

Contact Information 1

It would really help us if you provide further details. However you are not required to do so.

your name:
Mike (A name is required)

your email:
Optional - not required

in which situation did the error occur?
Optional - not required, but will be appreciated

Send Cancel

Необходимо сообщить свое имя, email и ситуацию – по желанию
